

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016.**



**Gobierno Municipal  
de Villa de Álvarez**

[www.villadealvarez.gob.mx](http://www.villadealvarez.gob.mx)

## Programas Presupuestales y Objetivos.


<b>Programa Presupuestal:</b>	1.2.1. Gestión de Recursos Extraordinarios
<b>Objetivo del Programa:</b>	Propiciar la inversión pública estatal y federal que contribuya al mejoramiento y progreso de Villa de Álvarez.
<b>Dirección:</b>	Desarrollo Social y Planeación.

<b>Programa Presupuestal:</b>	Programa 6.3.1.Más Infraestructura Vial y en Buenas Condiciones.
<b>Objetivo del Programa:</b>	Realizar acciones de mantenimiento a las principales avenidas y vialidades del Municipio, así como construir la infraestructura necesaria para garantizar un tránsito rápido y seguro por Villa de Álvarez.
<b>Dirección:</b>	Desarrollo Social y Planeación.

<b>Programa Presupuestal:</b>	Programa 6.3.2. Mejor Infraestructura Hidráulica.
<b>Objetivo del Programa:</b>	Dotar al Municipio de la infraestructura hidráulica necesaria, que evite inundaciones y accidente en tiempos de lluvias, por medio de acciones de mantenimiento y construcción de colectores pluviales, drenaje y bocas de tormenta.
<b>Dirección:</b>	Dirección de Desarrollo Social y Planeación.

### Causas y Efectos.


#### Programa 1.2.1. Gestión de Recursos Extraordinarios.

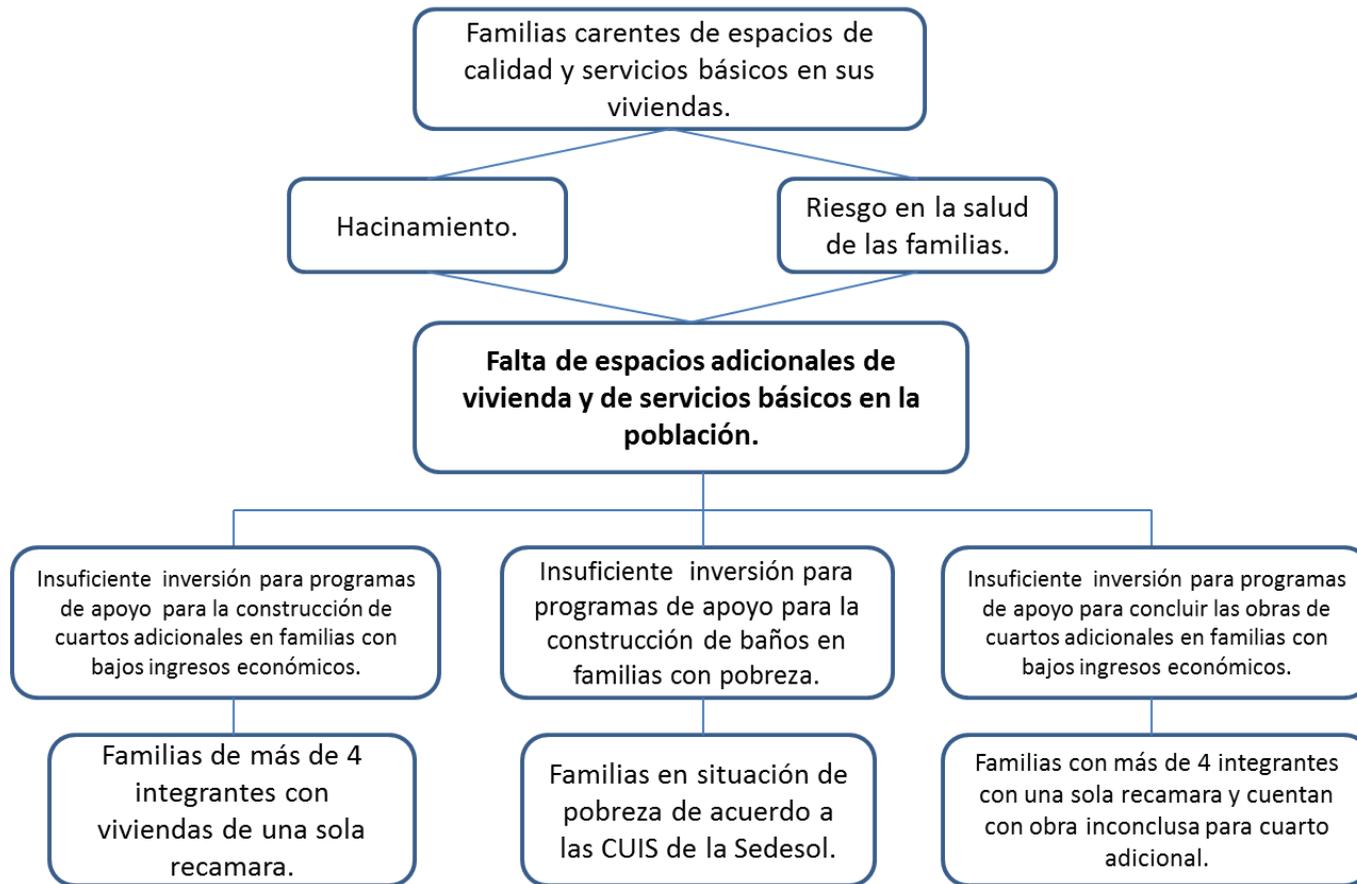

## Análisis del Problema con Árboles de Causa – Efectos y Medios –Fines.

### Medios y Fines.

#### Programa 1.2.1. Gestión de Recursos Extraordinarios.

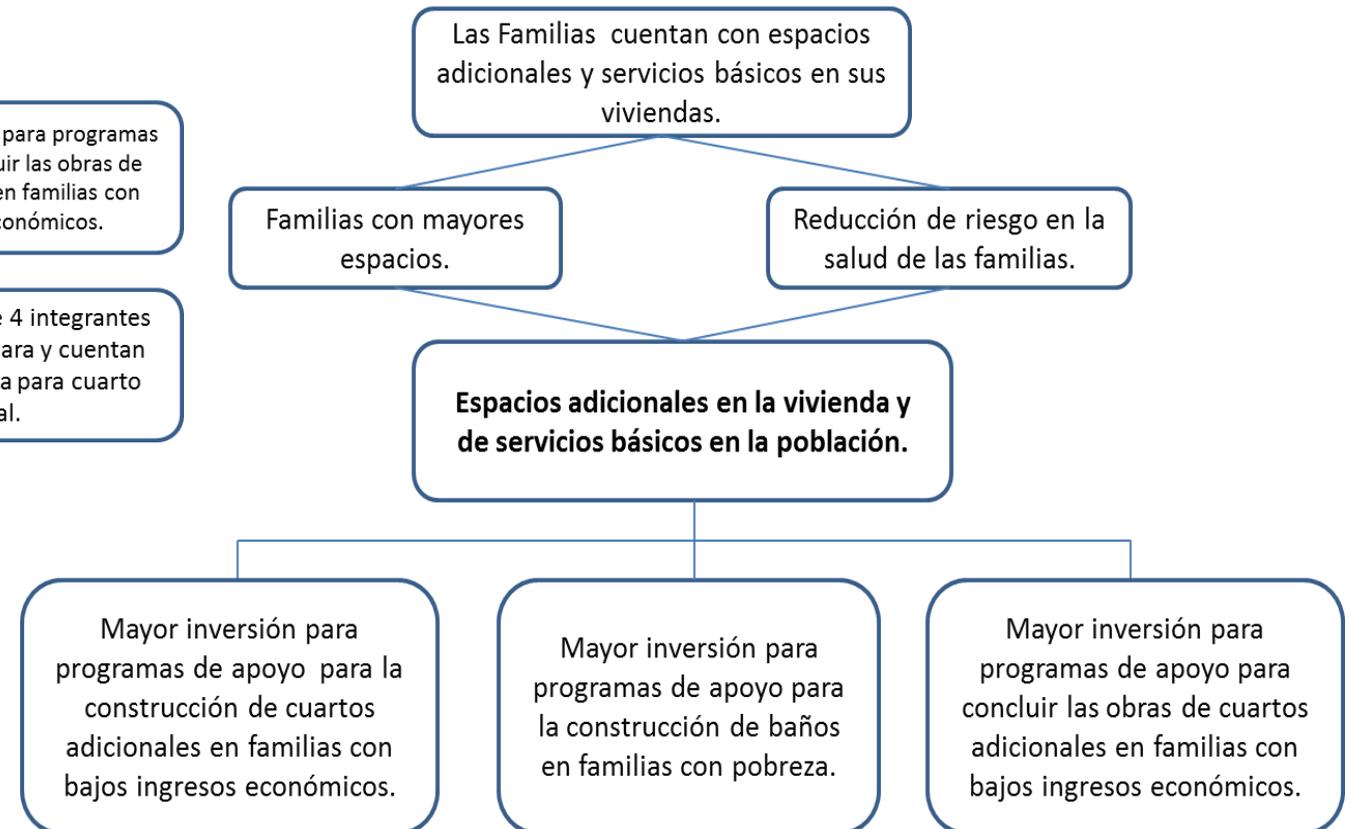

# MIR I.

## Gestión de Recursos Extraordinarios.

		1.2.1. Gestión de Recursos Extraordinarios		FICHA TÉCNICA.							
		Resumen Narrativo	Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Línea Base	Meta	Parámetro de Medición	Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Fin</b>		Contribuir a la ejecución del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal, mediante obras que atiendan a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y zonas de atención prioritarias.	Promedio de personas beneficiadas.	Total de personas beneficiadas por acciones de vivienda y servicios sanitarios / Total de personas programadas a beneficiar * 100	Número	4	4	Igual o mayor a la meta programada.	Anual.	Expedientes de entrega de obras.	Que el recurso no se asigne en tiempo y forma.
<b>Propósito</b>		La población en situación de hacinamiento y pobreza del Municipio de Villa de Álvarez, cuenta con cuartos adicionales y baños en la vivienda.	Porcentaje de personas beneficiadas.	Personas en situación de pobreza beneficiada con la construcción de servicios sanitarios y mejoramiento de vivienda / Personas en situación de pobreza programada a beneficiar con la construcción de servicios sanitarios y mejoramiento de vivienda * 100	Porcentual	0	100%	Igual o mayor a la meta programada.	Anual.	Expedientes o avances de obra.	Que el recurso no se asigne en tiempo y forma.
<b>Componentes</b>	<b>C1</b>	Infraestructura de servicios sanitarios construidos.	Porcentaje de familias beneficiadas con servicios sanitarios.	Número de familias con infraestructura sanitaria beneficiadas / Número de infraestructura sanitaria construida * 100	Porcentual	0	100%	Igual o mayor a la meta programada.	Semestral.	Registros administrativos.	Que el recurso no se asigne en tiempo y forma.
	<b>C2</b>	Viviendas con cuartos adicionales construidos.	Porcentaje de familias con hacinamiento beneficiadas con la construcción de cuarto adicional.	Número de familias con problemas de hacinamiento con necesidad de cuarto adicional beneficiadas / Número de familias a beneficiar programadas * 100	Porcentual	0	100%	Igual o mayor a la meta programada.	Semestral.	Expedientes o avances de obra.	Que el recurso no se asigne en tiempo y forma.
	<b>C3</b>	Construcción de techo firme para familias con hacinamiento.	Porcentaje de familias con hacinamiento beneficiadas con techo firme.	Número de familias con problemas de hacinamiento con necesidad de techo firme beneficiadas / Número de familias a beneficiar programadas * 100	Porcentual	0	100%	Igual o mayor a la meta programada.	Semestral.	Expedientes o avances de obra.	Que el recurso no se asigne en tiempo y forma.
<b>Actividades</b>	<b>A1C1</b>	Construcción de cuarto para baño en Comunidades Rurales de Mixcoate y Pueblo Nuevo.	Porcentaje de viviendas beneficiadas con cuarto para baño.	Número de viviendas con baño construido / Número de viviendas a beneficiar con baño programadas * 100	Porcentual	0	100%	Igual o mayor a la meta programada.	Trimestral.	Expedientes o avances de obra.	Que el recurso no se asigne en tiempo y forma.
	<b>A2C1</b>	Construcción de Baños con Biodigestores en la Comunidad de Picachos.	Porcentaje de baños con biodigestores construidos.	Número de baños con biodigestores construidos / Número de baños con biodigestores programados * 100	Porcentual	0	100%	Igual o mayor a la meta programada.	Trimestral.	Expedientes o avances de obra.	Que el recurso no se asigne en tiempo y forma.
	<b>A1C2</b>	Construcción de cuartos adicionales en viviendas con familias en situación de hacinamiento.	Porcentaje de viviendas beneficiadas con cuarto adicional.	Número de viviendas beneficiadas con cuarto adicional / Número de viviendas con cuartos adicionales programadas * 100	Porcentual	0	100%	Igual o mayor a la meta programada.	Trimestral.	Expedientes o avances de obra.	Que el recurso no se asigne en tiempo y forma.
	<b>A1C3</b>	Construcción de techo firme para familias con hacinamiento en zona urbana y rural.	Porcentaje de viviendas beneficiadas con techo firme.	Número de viviendas beneficiadas con techo firme / Número de viviendas con programadas * 100	Porcentual	0	100%	Igual o mayor a la meta programada.	Trimestral.	Expedientes o avances de obra.	Que el recurso no se asigne en tiempo y forma.

## MIR anual número I.


### Gestión de Recursos Extraordinarios.

		FICHA TÉCNICA.									
		Resumen Narrativo	Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Línea Base	Meta	Parámetro de Medición	Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Fin</b>		Contribuir a la ejecución del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal, mediante obras que atiendan a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y zonas de atención prioritarias.	Promedio de personas beneficiadas.	552 / 100	Número	4	5.52	Mayor a la Meta programada.	Anual.	Expedientes de entrega de obras.	Que el recurso no se asigne en tiempo y forma.
<b>Propósito</b>		La población en situación de hacinamiento y pobreza del Municipio de Villa de Álvarez, cuenta con cuartos adicionales y baños en la vivienda.	Porcentaje de personas beneficiadas.	545 / 468 * 100	Porcentual	0	116%	Mayor a la Meta programada.	Anual.	Expedientes o avances de obra.	Que el recurso no se asigne en tiempo y forma.
<b>Componentes</b>	<b>C1</b>	Infraestructura de servicios sanitarios construidos.	Porcentaje de familias beneficiadas con servicios sanitarios.	23 / 25 * 100	Porcentual	0	92%	Igual a la meta programada.	Semestral.	Registros administrativos.	Que el recurso no se asigne en tiempo y forma.
	<b>C2</b>	Viviendas con cuartos adicionales construidos.	Porcentaje de familias con hacinamiento beneficiadas con la construcción de cuarto adicional.	59 / 59 * 100	Porcentual	0	100%	Igual a la meta programada.	Semestral.	Registros administrativos.	Que el recurso no se asigne en tiempo y forma.
	<b>C3</b>	Construcción de techo firme para familias con hacinamiento.	Porcentaje de familias con hacinamiento beneficiadas con techo firme.	22 / 16 * 100	Porcentual	0	137.5%	Igual a la meta programada.	Semestral.	Registros administrativos.	Que el recurso no se asigne en tiempo y forma.
<b>Actividades</b>	<b>A1C1</b>	Construcción de cuarto para baño en Comunidades Rurales de Mixcoate y Pueblo Nuevo.	Porcentaje de viviendas beneficiadas con cuarto para baño.	6 / 10 * 100	Porcentual	0	60%	Igual a la meta programada.	Trimestral.	Expedientes o avances de obra.	Que el recurso no se asigne en tiempo y forma.
	<b>A2C1</b>	Construcción de Baños con Biodigestores en la Comunidad de Picachos.	Porcentaje de baños con biodigestores construidos.	17 / 15 * 100	Porcentual	0	113%	Igual a la meta programada.	Trimestral.	Expedientes o avances de obra.	Que el recurso no se asigne en tiempo y forma.
	<b>A1C2</b>	Construcción de cuartos adicionales en viviendas con familias en situación de hacinamiento.	Porcentaje de viviendas beneficiadas con cuarto adicional.	59 / 59 * 100	Porcentual	0	100%	Igual a la meta programada.	Trimestral.	Expedientes o avances de obra.	Que el recurso no se asigne en tiempo y forma.
	<b>A1C3</b>	Construcción de techo firme para familias con hacinamiento en zona urbana y rural.	Porcentaje de viviendas beneficiadas con techo firme.	22 / 16 * 100	Porcentual	0	137.5%	Igual a la meta programada.	Trimestral.	Expedientes o avances de obra.	Que el recurso no se asigne en tiempo y forma.

# Análisis del Problema con Árboles de Causa – Efectos y Medios –Fines.


## Causas y Efectos.

### Programa 6.3.1.Más Infraestructura Vial y en Buenas Condiciones.

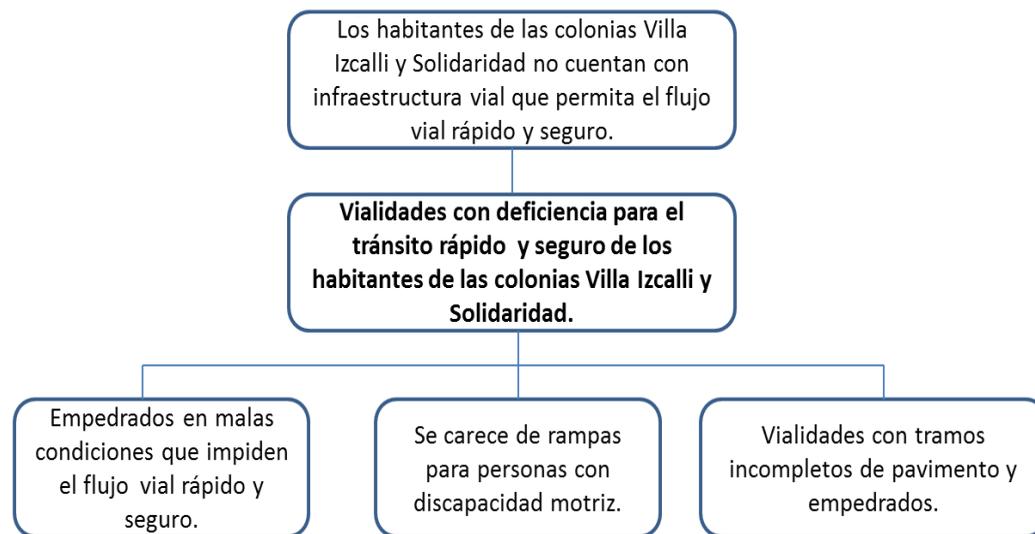

## Medios y Fines.

### Programa 6.3.1.Más Infraestructura Vial y en Buenas Condiciones.

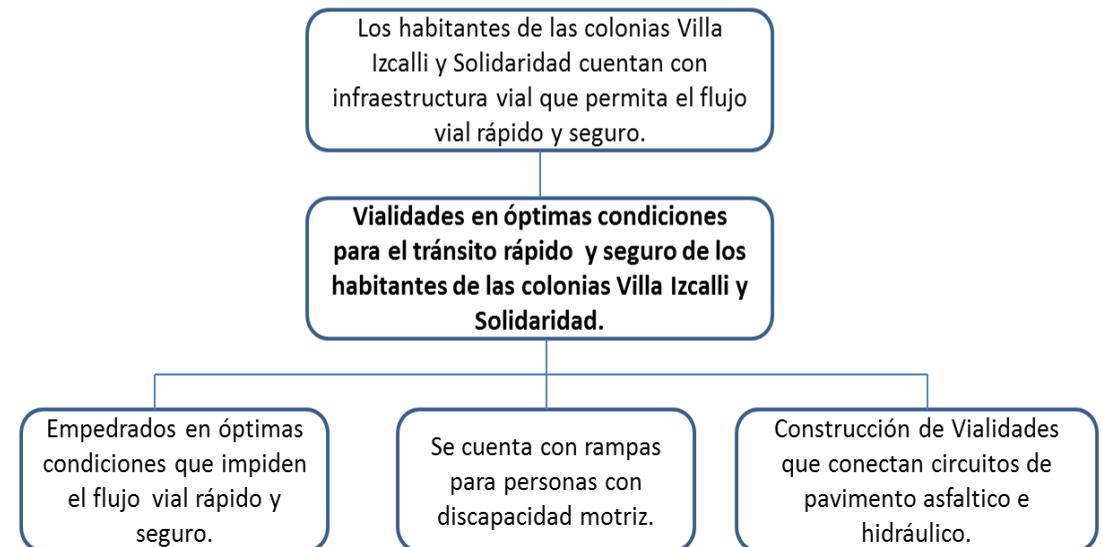

## MIR II.

### Más Infraestructura Vial y en Buenas Condiciones.

Programa 6.3.1. Más Infraestructura Vial y en Buenas Condiciones.		FICHA TÉCNICA.									
Resumen Narrativo		Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Línea Base	Meta	Parámetro de Medición	Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	
<b>Fin</b>		Contribuir a la ejecución del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal, mediante obras que atiendan a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y zonas de atención prioritarias.	Porcentaje de personas beneficiadas.	Personas beneficiadas / Personas a beneficiar * 100	Porcentual.	100%	100%	Igual o mayor a la meta programada.	Anual.	Expedientes de entrega de obra y cumplimiento de las metas programadas.	Que el recurso no se asigne en tiempo y forma.
<b>Propósito</b>		Los colonos de Villa Izcalli y Solidaridad cuentan con el beneficio directo de vialidades con pavimento asfáltico y de concreto hidráulico que permiten un mejor flujo vial seguro a sus comunidades y colonias colindantes.	Porcentaje de Mts <sup>2</sup> de pavimentos construidos con los requerimientos programados.	Cantidad de mts <sup>2</sup> pavimentos construidos con los requerimientos / Cantidad de mts <sup>2</sup> de pavimentos programados * 100	Número.	0	100%	Igual o mayor a la meta programada.	Semestral.	Encuesta de satisfacción de los beneficiarios.	Que el recurso no se asigne en tiempo y forma.
<b>Componentes</b>	<b>C1</b>	Vialidades con pavimentación construidas.	Porcentaje de Mts <sup>2</sup> de pavimentos construidos.	Mts <sup>2</sup> de pavimentación programada / Mts <sup>2</sup> de pavimentación construida de acuerdo a los requerimientos * 100	Porcentual.	0	100%	Igual o mayor a la meta programada.	Trimestral.	Expedientes o avances de obra.	Que el recurso no se asigne en tiempo y forma.
<b>Actividades</b>	<b>A1C1</b>	Pavimentación de Circuito Chían y Laguna del Jabalí, Colonia Solidaridad.	Porcentaje de Mts <sup>2</sup> de pavimento hidráulico construido.	Mts <sup>2</sup> de pavimentación de concreto hidráulico programado / Mts <sup>2</sup> de pavimentación construida de acuerdo a los requerimientos * 100	Porcentual.	0	100%	Igual o mayor a la meta programada.	Trimestral.	Expedientes o avances de obra.	Que el recurso no se asigne en tiempo y forma.
	<b>A2C1</b>	Construcción de reempedrados en Circuito Chían y Laguna del Jabalí, Colonia Solidaridad.	Porcentaje de Mts <sup>2</sup> de empedrados construidos.	Mts <sup>2</sup> de reempedrados construidos / Mts <sup>2</sup> de reempedrados programados * 100	Porcentual.	0	100%	Igual o mayor a la meta programada.	Trimestral.	Expedientes o avances de obra.	Que el recurso no se asigne en tiempo y forma.
	<b>A3C1</b>	Pavimentación de calle Xoloapan entre Tekuan y Chachopan, Colonia Villa Izcalli.	Porcentaje de Mts <sup>2</sup> de pavimento asfáltico construido.	Mts <sup>2</sup> de pavimentación asfáltica programada por concluir / Mts <sup>2</sup> de pavimentación construida de acuerdo a los requerimientos * 100	Porcentual.	0	100%	Igual o mayor a la meta programada.	Trimestral.	Expedientes o avances de obra.	Que el recurso no se asigne en tiempo y forma.


## MIR anual número II.

### Más Infraestructura Vial y en Buenas Condiciones.


		FICHA TÉCNICA.									
		Resumen Narrativo	Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Línea Base	Meta	Parámetro de Medición	Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Fin</b>		Contribuir a la ejecución del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal, mediante obras que atiendan a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y zonas de atención prioritarias.	Porcentaje de personas beneficiadas.	$382 / 382 * 100$	Porcentual.	100%	100%	Igual a la meta programada.	Anual.	Registros administrativos, Expedientes y proyecto de obra.	Que haya un recorte presupuestal al recurso federal.
<b>Propósito</b>		Los colonos de Villa Izcalli y Solidaridad cuentan con el beneficio directo de vialidades con pavimento asfáltico y de concreto hidráulico que permiten un mejor flujo vial seguro a sus comunidades y colonias colindantes.	Porcentaje total de Mts <sup>2</sup> de pavimentos construidos y empedrados.	$3,597.99 / 3,597.99 * 100$	Porcentual.	0	100%	Igual a la meta programada.	Semestral.	Registros administrativos, Expedientes y proyecto de obra.	Que haya un recorte presupuestal.
<b>Componentes</b>	<b>C1</b>	Vialidades con pavimentación construidas.	Porcentaje de Mts <sup>2</sup> de pavimentos construidos.	$2,145.99 / 2,145.99 * 100$	Porcentual.	0	100%	Igual a la meta programada.	Trimestral.	Registros administrativos, Expedientes y proyecto de obra.	Que haya un recorte presupuestal.
<b>Actividades</b>	<b>A1C1</b>	Pavimentación de Circuito Chían y Laguna del Jabalí, Colonia Solidaridad.	Porcentaje de Mts <sup>2</sup> de pavimento hidráulico construido.	$1,469.77 / 1,469.77 * 100$	Porcentual.	0	100%	Igual a la meta programada.	Trimestral.	Registros administrativos, Expedientes y proyecto de obra.	Que haya un recorte presupuestal.
	<b>A2C1</b>	Construcción de reempedrados en Circuito Chían y Laguna del Jabalí, Colonia Solidaridad.	Porcentaje de Mts <sup>2</sup> de empedrados construidos.	$1,352 / 1,352 * 100$	Porcentual.	0	100%	Igual a la meta programada.	Trimestral.	Registros administrativos, Expedientes y proyecto de obra.	Que haya un recorte presupuestal.
	<b>A3C1</b>	Pavimentación de calle Xoloapan entre Tekuan y Chanchopan, Colonia Villa Izcalli.	Porcentaje de Mts <sup>2</sup> de pavimento asfáltico construido.	$776.22 / 776.22 * 100$	Porcentual.	0	100%	Igual a la meta programada.	Trimestral.	Registros administrativos, Expedientes y proyecto de obra.	Que haya un recorte presupuestal.

# Análisis del Problema con Árboles de Causa – Efectos y Medios –Fines.

## Causas y Efectos. Programa 6.3.2. Mejor Infraestructura Hidráulica.

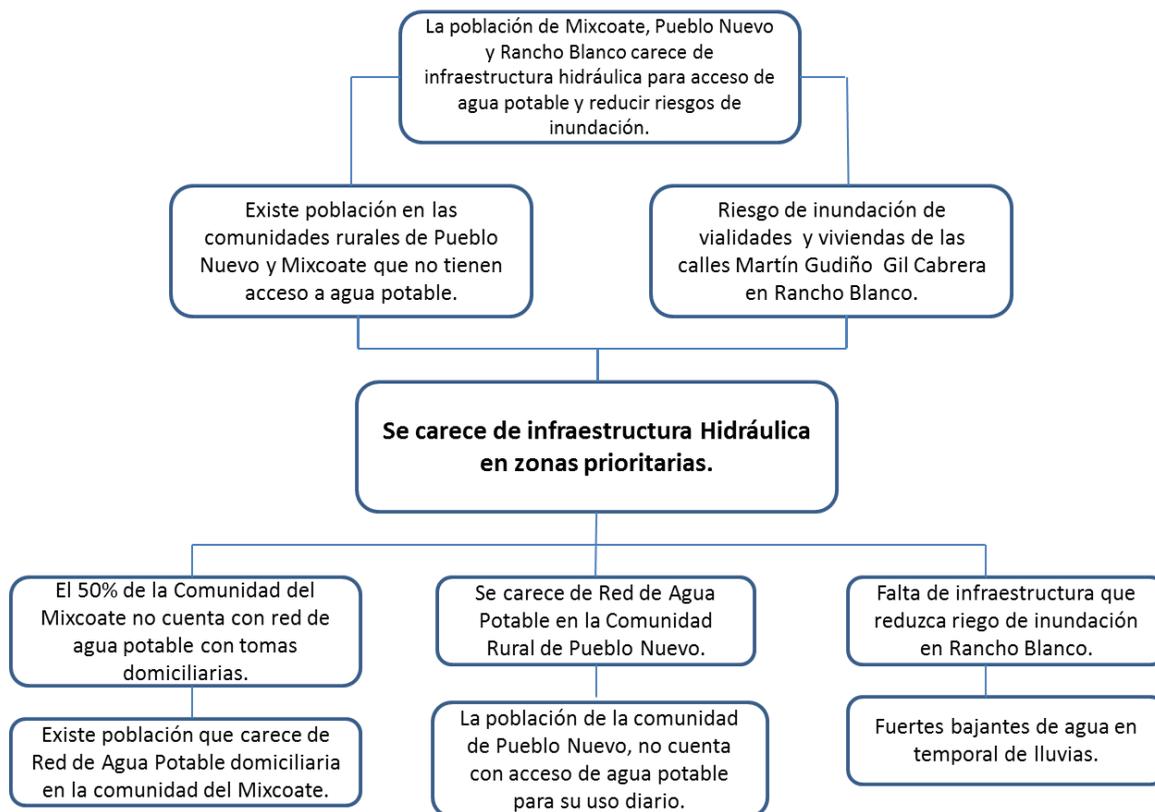

## Medios y Fines. Programa 6.3.2. Infraestructura Hidráulica.

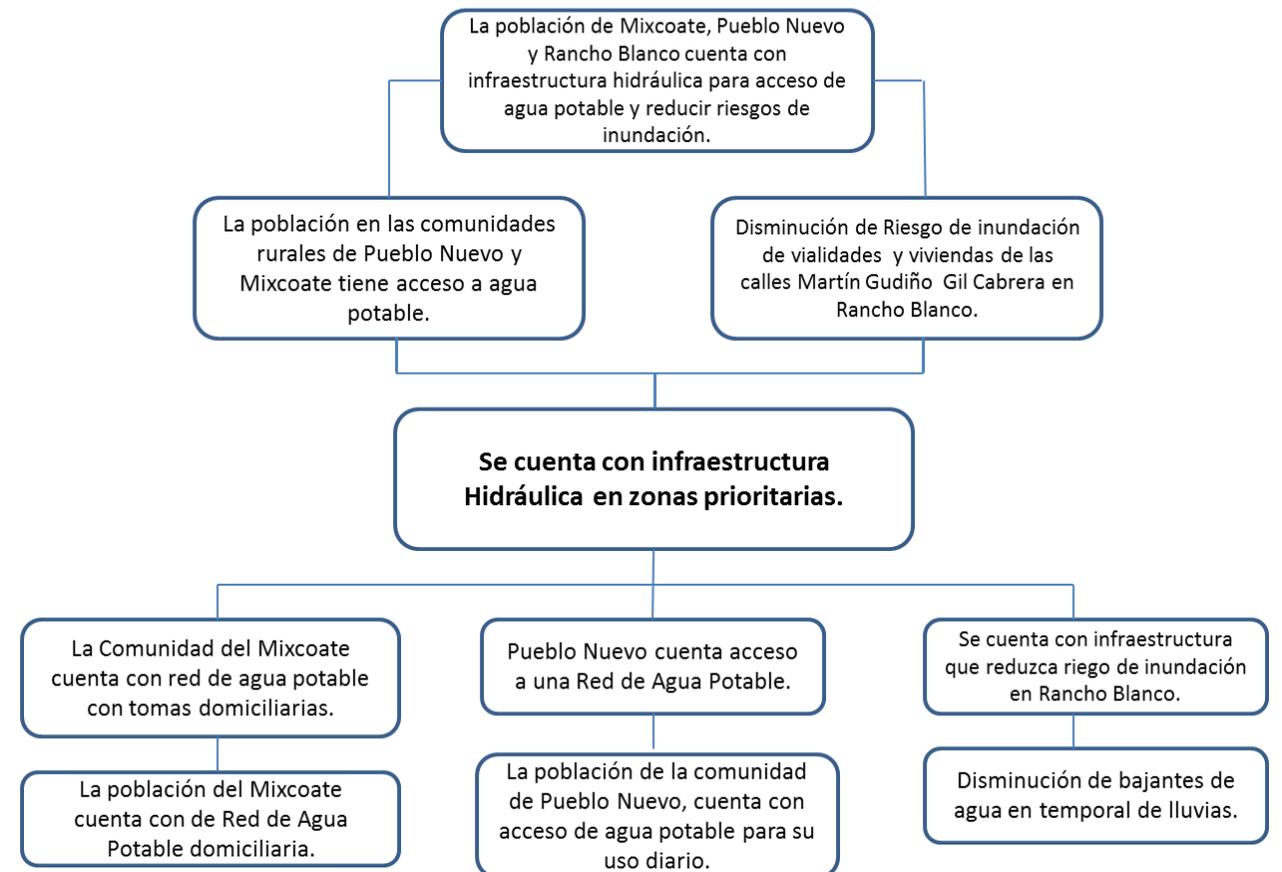

## MIR III.

### Mejor Infraestructura Hidráulica.

		Programa 6.3.2. Mejor Infraestructura Hidráulica.		FICHA TÉCNICA.							
		Resumen Narrativo	Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Línea Base	Meta	Parámetro de Medición	Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Fin</b>		Contribuir a la ejecución del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal, mediante obras que atiendan a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y zonas de atención prioritarias.	Porcentaje de personas beneficiadas.	Número de habitantes / Número de habitantes beneficiados * 100	Porcentual	100	100%	Igual o mayor a la meta programada.	Anual.	Expedientes de obras concluidas.	Que el recurso no se asigne en tiempo y forma.
<b>Propósito</b>		La población de las comunidades rurales de Mixcoate y Pueblo Nuevo, así como de la colonia Rancho Blanco cuenta con nueva infraestructura hidráulica que permite el acceso al agua potable, así como la instalación de boca de tormentas para evitar el riesgo de inundación.	Porcentaje de personas beneficiadas.	Número de habitantes / Número de habitantes beneficiados * 100	Porcentual	100	100%	Igual o mayor a la meta programada.	Anual.	Expedientes de obras concluidas.	Que el recurso no se asigne en tiempo y forma.
<b>Componentes</b>	<b>C1</b>	Red de agua potable con toma domiciliaria en comunidad rural construida.	Porcentaje de metros de red de agua potable construido.	Metros de red de agua potable construido /Metros de red de agua potable programados * 100	Porcentual	0	100%	Igual o mayor a la meta programada.	Semestral.	Expedientes o avances de obra.	Que el recurso no se asigne en tiempo y forma.
	<b>C2</b>	Red de agua potable con una sola toma de agua pública en comunidad rural construida.	Porcentaje de personas beneficiadas.	Metros de red de agua potable construido /Metros de red de agua potable programados * 100	Porcentual	0	100%	Igual o mayor a la meta programada.	Semestral.	Expedientes o avances de obra.	Que el recurso no se asigne en tiempo y forma.
	<b>C3</b>	Boca de tormenta en zonas de afectación pluvial construidas.	Porcentaje de Boca de tormentas construidas.	Número de boca de tormenta programadas / Número de Boca de tormenta construidas con los requerimientos necesarios * 100	Porcentual.	0	100%	Igual o mayor al número programado.	Semestral.	Expedientes o avances de obra.	Que el recurso no se asigne en tiempo y forma.
<b>Actividades</b>	<b>A1C1</b>	Construcción de Red de Agua Potable en la Comunidad rural del Mixcuate con tomas domiciliarias.	Red de agua potable construida.	(Porcentaje de red de agua potable construida + Porcentaje de red de agua potable existente / 100) * 100	Porcentual	50%	100%	Igual o mayor a la meta programada.	Trimestral.	Expedientes o avances de obra.	Que el recurso no se asigne en tiempo y forma.
	<b>A1C2</b>	Construcción de Red de Agua Potable en la Comunidad de Pueblo Nuevo con una toma de agua pública.	Porcentaje de red de agua Potable construida.	Metros de red de agua potable construida / Metros de red de agua potable programada * 100	Porcentual	0	100%	Igual o mayor a la meta programada.	Trimestral.	Expedientes o avances de obra.	Que el recurso no se asigne en tiempo y forma.
	<b>A1C3</b>	Construir 5 bocas de tormenta con especificaciones requeridas para evitar inundaciones en las viviendas de las zonas afectadas.	Porcentaje de Boca de tormentas construidas.	Número de boca de tormenta programada / Número de Boca de tormenta construidas con los requerimientos necesarios * 100	Porcentual.	0	100%	Igual o mayor al número programado.	Trimestral.	Expedientes o avances de obra.	Que el recurso no se asigne en tiempo y forma.

## MIR anual número III.

### Mejor Infraestructura Hidráulica.

FICHA TÉCNICA.											
		Resumen Narrativo	Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Línea Base	Meta	Parámetro de Medición	Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Fin</b>		Contribuir a la ejecución del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal, mediante obras que atiendan a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y zonas de atención prioritarias.	Porcentaje de personas beneficiadas.	$322 / 322 * 100$	Porcentual	100	100%	Igual a la meta programada.	Anual.	Expedientes de obras concluidas.	Que haya un recorte presupuestal al recurso federal.
<b>Propósito</b>		La población de las comunidades rurales de Mixcuate y Pueblo Nuevo cuenta con una de red de agua potable que permite el acceso al agua potable en sus hogares, así como la población de Rancho Blanco cuenta con boca de tormentas para evitar el riesgo de inundación.	Porcentaje de personas beneficiadas.	$322 / 322 * 100$	Porcentual	100	100%	Igual a la meta programada.	Anual.	Expedientes de obras concluidas.	Que haya un recorte presupuestal.
<b>Componentes</b>	<b>C1</b>	Red de agua potable con toma domiciliaria en comunidad rural construida.	Metros de Red de Agua Potable construido.	$3,050 / 3,050 * 100$	Porcentual	0	100%	Igual a la meta programada.	Semestral.	Expedientes técnicos.	Que haya un recorte presupuestal.
	<b>C2</b>	Red de agua potable con una sola toma de agua pública en comunidad rural construida.	Porcentaje de personas beneficiadas.	$457 / 457 * 100$	Porcentual	0	100%	Igual o mayor a la meta programada.	Semestral.	Expedientes o avances de obra.	Que el recurso no se asigne en tiempo y forma.
	<b>C3</b>	Boca de tormenta en zonas de afectación pluvial construidas.	Porcentaje de Bocas de tormentas construidas.	$5 / 5 * 100$	Porcentual.	0	100%	Igual a la meta programada.	Semestral.	Expedientes y proyecto de obra.	Que haya un recorte presupuestal al recurso federal.
<b>Actividades</b>	<b>A1C1</b>	Construcción de Red de Agua Potable en la Comunidad de Mixcuate.	Red de agua potable construida.	$3,050 / 3,050 * 100$	Porcentual	0	100%	Igual a la meta programada.	Trimestral.	Expedientes técnicos.	Que haya un recorte presupuestal.
	<b>A2C1</b>	Construcción de Red de Agua Potable en la Comunidad de Pueblo Nuevo.	Porcentaje de red de agua Potable construida.	$457 / 457 * 100$	Porcentual	0	100%	Igual a la meta programada.	Trimestral.	Expedientes técnicos.	Que haya un recorte presupuestal.
	<b>A1C2</b>	Construir 5 bocas de tormenta con especificaciones requeridas para evitar inundaciones en las viviendas de las zonas afectadas.	Porcentaje de Bocas de tormentas construidas.	$5 / 5 * 100$	Porcentual.	0	100%	Igual a la meta programada.	Trimestral.	Registros administrativos, Expedientes y proyecto de obra.	Que haya un recorte presupuestal al recurso federal.

## Datos Técnicos Generales.

### Datos utilizados en la verificación de cumplimiento de metas establecidos en cada MIR.

CONCEPTO:	MEDIDA:
Mts <sup>2</sup> de Pavimento asfáltico (Xoloapan):	776.22
Personas a beneficiar en Pavimentación de Xoloapan:	72
Mts <sup>2</sup> de Pavimento hidráulico en Circuito Chían - Laguna del Jabalí - Chían, Colonia Solidaridad:	1,469.77
Mts <sup>2</sup> de re empedrado en Circuito Chían - Laguna del Jabalí, Colonia Solidaridad.	1,352
Mts <sup>2</sup> de cruceros en Circuito Chían - Laguna del Jabalí - Chían, Colonia Solidaridad:	835
Mts <sup>2</sup> de pasa calle en Circuito Chían - Laguna del Jabalí - Chían, Colonia Solidaridad:	613.84
Mts <sup>2</sup> rampas para discapacitado Circuito Chían - Laguna del Jabalí - Chían, Colonia Solidaridad:	126.53
Mts <sup>2</sup> Machuelo y Banqueta Circuito Chían - Laguna del Jabalí - Chían, Colonia Solidaridad:	1,516
Personas a beneficiar en pavimentación Circuito Chían y Laguna del Jabalí:	310
Total de personas beneficiadas con obras de pavimentación asfáltica e hidráulica:	382
Total de Mts <sup>2</sup> con las obras de pavimentación asfáltica e hidráulica:	2,245.99
Población Mixcuate (Inegi):	303
Población Las Colonias Pueblo Nuevo (Inegi).	19
Población Total de Comunidades Beneficiadas:	322
Mts. De Red de Agua Potable Mixcuate:	3,050
Mts. De Red de Agua Potable Pueblo Nuevo:	457
Total de Mts. De Red de Agua construidos:	3,507
No. Cuartos p/baños programados:	10
No. Cuartos p/baños construidos:	6
No. Personas beneficiadas con baños:	27
No. de baños con biodigestor construidos:	15
No. de baños con biodigestor programados:	17
No. de familias beneficiadas con baños con biodigestor.	17
No. de personas beneficiadas con baño con biodigestor:	60
No. de cuartos adicionales programados:	59
No. de cuartos adicionales construidos:	59
No. de personas beneficiadas con cuartos adicionales:	359
No. de techo firme construidos:	22
No. de techo firme programado:	16
No. personas beneficiadas con techo firme:	99
No. de familias beneficiadas con techo firme:	22
