



LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO SA DE CV
LIB. MARCELINO GARCÍA BARRAGAN 36
LAS BUGAMBILIAS
COLIMA, COLIMA CP: 28090
RFC: LED111208H83

Factura

Fecha	Folio
23/sep./2021 10:15:10	A6637

Cliente
MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL
J. MERCED CABRERA 55 CENTRO, VILLA DE ALVAREZ COLIMA, COL. CP: 28970 RFC: MVA8501014HA

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
FISM-04-ICT-C/2021	CONTADO	TERE	

Artículo	Clave SAT	Nombre	U.med.	Clave SAT	Unidades	Precio	Desc.to.	Importe
SER	39111603	PAGO PORCONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 (UNO) DE LA OBRA FISM-04-ICT-C/2021-VA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VILLA DE ALVAREZ MENOS DESCUENTOS: * 30%AMORT. DEL ANTICIPO \$ 117,763.88 * 16% IVA DEL ANTICIPO \$18,842.22 * 0.5% PARA VIGILANCIA Y CONTROL SFP \$ 1,962.73 * 0.5% PARA CONS.Y MANTTO.DE A. REC.\$ 1,962.73	SERV	E48	1	455,353.65		455,353.65

Amortización	Importe	Impuesto
Amortización	117,763.88	18,842.22

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.11667EEAED-9685-C141-BCD4-20E05F2C98AA17021-09-23T10:27:36|SCD110105654|XvRu1RDing2PhWkXN3ZIC9F6BmesgLRNqW2bywWBSZvOG/Fp6Y1d5Q/3adTrgo+Ln6gkonvQoRVc9c/rQzHJWRkmePjev2WV3F5UWZ5+XGRFDC4raPNB3Vlr
KsPGYWDiWZP52w6Vn+8LPSuin0wyCD0pgj/CULD6G0jFVJpPEfeUR9dPVGn355vumNZ149Pw625k1YDRd97FzuX82TZulHI+OGKpo3Gg9G4uR3bM47QScytleHJjrJZD3567PnAdm7qQ/CWkOpNKQ/Zxd59haviqQdprc3wX1Aauep92agq+19ur04CvPTesBOGe

Sello digital del CFDI:

rXvRu1RDing2PhWkXN3ZIC9F6BmesgLRNqW2bywWBSZvOG/Fp6Y1d5Q/3adTrgo+Ln6gkonvQoRVc9c/rQzHJWRkmePjev2WV3F5UWZ5+XGRFDC4raPNB3VlrKsPGYWDiWZP52w6Vn+8LPSuin0wyCD0pgj/CULD6G0jFVJpPEfeUR9dPVGn355vumNZ14
9Pw625k1YDRd97FzuX82TZulHI+OGKpo3Gg9G4uR3bM47QScytleHJjrJZD3567PnAdm7qQ/CWkOpNKQ/Zxd59haviqQdprc3wX1Aauep92agq+19ur04CvPTesBOGeYszQRqj+5w==

Sello digital del SAT:

sQvZ+zuU93N1wZIT152zL44BQZvjx4LSBHAmEj+PBbcqVX0/tpT63/N5BCEa5YaPqktjZerqSMcZ425+Ep/4xEGPpeFtw0EtLW1DQGHV+NUSLBeAdQm7cTMD/Jwv+xBIRxiDMiFGPW1h9qJaQ0xbv7uOn0M9vdWxdufr5aWMxYajQmZ/C9CbKZglUmE3OBR0lj
CJ/g78nu0mgpG3Bewqn44JsmDxmF2WY4Iola4kovEJaAmVd7jaAaUzeV4NS3yRmgvKW5QFLeQunwFdeE9gRPAu005bCawhT2Bo86p5K98us:G8e/ZLA3Z0X53pfzHyFN69M2KznWPPQ==



(Trescientos catorce mil ochocientos veintidos pesos 09/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	455,353.65
Importe neto	271,398.35
TASA 16%	43,423.74
Total	314,822.09


Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: 667EEAED-9685-C141-BCD4-20E05F2C98AA Fecha de certificación: 23/sep./2021 10:27:36
Certificado del emisor: 00001000000504362196 Certificado del SAT: 00001000000502000436



CARÁTULA DE ESTIMACIÓN DE OBRA
DIR. DE CONSTRUCCIÓN
Revisión 01
2021



2



ESTADO DE CUENTA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
Revisión 01
2021

[illegible]

MARTIN EDUARDO CORTES GUZMAN
CONTRATISTA

~~ING. JUAN CARLOS SANTOS ANDRADE
RESIDENTE O SUPER.~~

ARQ. HECTOR NEJIA RUELAS
JEFE DE SUPERVISOR

~~DIR. DE A. DE CONTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS~~



ESTIMACIÓN DE OBRA
DIR. DE CONSTRUCCIÓN
Revisión 01
2021



FISM-04-ICT-C/2021-VA										ESTIMACIÓN NUM: 1 (UNO)		2018-2021	
CONTRATO: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ÁPERIDO:										28 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021			
UBICACIÓN: VARIAS COLONIAS COL. MONTELLANO, REAL DE MINAS, LOMAS ALTAS, CARLOS DE LA MADRID, SOLIDARIDAD, LINDA VISTA, PRA													
MUNICIPIO: VILLA DE ALVAREZ										HOJA NUM:			
CONTRATISTA: LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO S.A. DE C.V.										FECHA: 31 DE JULIO DE 2021			
ING. JUAN CARLOS SANTOS ANDRADE										ARQ. HECTOR MEZA FUELAS			
RESIDENTE O SUPER.										JEFE DE SUPERVISOR			
CONCEPTO										UNIDAD DE MEDIDA			
Nº DE HOJA GENERADOR										ESTIMACIÓN ANTERIOR		ESTA ESTIMACIÓN	
DIR. DE A. DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS										ESTIMADO A LA FECHA		SEGUN PRESUPUESTO	
VOLUMEN EXCEDENTE													
PRECIO UNITARIO													
SUB-TOTAL										\$ 3,140.37		\$ 392,546.25	
I.V.A.										\$		\$ 62,807.40	
TOTAL										\$		\$ 455,353.65	
IMPORTE													
1	1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED DE 50 A 55 WATTS 7.000 LÚMENES MÍNIMO CON VIDA MÍNIMA DE 150.000.00 HORAS. LENTE ANTI VANDÁLICO CON MÍNIMO 95% DE TRANSPARENCIA QUE SE GARANTICE DE POR VIDA REMPLAZABLE EN SITIO. CON DISIPADOR DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA, CARCASA DE MATERIALES ANTICORROSIVOS RESISTENTES	LUMINARIA	1 al 3	125	125	0	15	0	500	0	\$	\$
2	2	BRAZO METÁLICO PARA LUMINARIA COMPATIBLE CON EL MODELO PROPUESTO. INCLUYE: DESINSTALACIÓN DEL EXISTENTE EN SU CASO. RESGUARDO Y ENTREGA A LA DEPENDENCIA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	0	0	0	0	15	0	15	0	\$	\$
3	3	FOTOCELDA 220 CA 50/60 HZ. RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA PIRECEPTACULO Y COLILLAS PARA LUMINARIA COMPATIBLE CON EL MODELO PROPUESTO. INCLUYE: DESINSTALACIÓN DEL EXISTENTE EN SU CASO. RESGUARDO Y ENTREGA A LA DEPENDENCIA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO	PZA	0	0	0	0	15	0	15	0	\$	\$
4	4	CABLE DE COBRE CAL 12. INCLUYE: DESINSTALACIÓN DEL EXISTENTE EN SU CASO. RESGUARDO Y ENTREGA A LA DEPENDENCIA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M	0	0	0	0	509.7912	0	509.7912	0	\$	\$
5	5	CABLE DE ALUMINIO 2+1 CALIBRE 6. INCLUYE: DESINSTALACIÓN DEL EXISTENTE EN SU CASO. RESGUARDO Y ENTREGA A LA DEPENDENCIA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M	0	0	0	0	200	0	200	0	\$	\$
0	0		0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	\$	\$
0	0		0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	\$	\$



GOBIERNO MUNICIPAL
DE VILLA DE ÁLVAREZ
2018-2021

RESUMEN DE ESTIMACIÓN DE OBRA DIR. DE CONSTRUCCIÓN

Revisión 01
2021



CONTRATO: FISM-04-ICT-C/2021-1-VA				ESTIMACIÓN NUM:				1 (UNO)				2018-2021				
OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIAS COLONIAS DE VILLA				PERIODO: 28 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021												
UBICACIÓN: VARIAS COLONIAS COL. MONTELLANO, REAL DE MINAS, LOMAS ALTAS, CARLOS DE LA MADRID, SOLIDARIDAD, LINDA VISTA, PRADOS DE LA VILLA																
MUNICIPIO: VILLA DE ALVAREZ				HOJA NUM:				31 DE JULIO DE 2021								
CONTRATISTA: LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO S.A. DE C.V.				ING. JUAN CARLOS SANTOS ANDRADE				0								
CONTRATISTA: MARTÍN EDUARDO CORPES GÓZMAN				JEFE DE SUPERVISOR												
Nº	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	Nº DE HOJA GENERADOR	ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMADO A LA FECHA	SEGUN PRESUPUESTO	VOLUMEN EXCEDENTE	PRECIO UNITARIO			IMPORTE			
										SUB-TOTAL	I.V.A.	TOTAL	SUB-TOTAL	I.V.A.	TOTAL	
1	1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED DE 50 A 55 WATTS 7.000 LÚMENES MÍNIMO CON VIDA MÍNIMA DE 150.000.00 HORAS, LENTE ANTI VANDÁLICO CON MÍNIMO 95% DE TRANSPARENCIA QUE SE GARANTICE DE POR VIDA REMPLAZABLE EN SITIO, CON DISIPADOR DE CALOR, CON EL MODELO PROPUESTO. INCLUYE: DESINSTALACIÓN DEL EXISTENTE EN SU CASO, RESGUARDO Y ENTREGA A LA DEPENDENCIA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	LUMINARIA	1 al 3	0	125.0000	125.00	500.00	0.00	\$	3,140.37	\$	\$	392,546.25	\$	392,546.25
2	2	BRASO METÁLICO PARA LUMINARIA COMPATIBLE CON EL MODELO PROPUESTO. INCLUYE: DESINSTALACIÓN DEL EXISTENTE EN SU CASO, RESGUARDO Y ENTREGA A LA DEPENDENCIA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA		0	0.0000	0.00	15.00	0.00	\$	1,097.45	\$	\$	-	\$	-
3	3	FOTOCELDA 220 CA 50/60 HZ, RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA PRECEPTACULO Y COLILLAS PARA LUMINARIA COMPATIBLE CON EL MODELO PROPUESTO. INCLUYE: DESINSTALACIÓN DEL EXISTENTE EN SU CASO, RESGUARDO Y ENTREGA A LA DEPENDENCIA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA		0	0.0000	0.00	15.00	0.00	\$	663.23	\$	\$	-	\$	-
4	4	CABLE DE COBRE CAL. 12, INCLUYE: DESINSTALACIÓN DEL EXISTENTE EN SU CASO, RESGUARDO Y ENTREGA A LA DEPENDENCIA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M		0	0.0000	0.00	509.79	0.00	\$	36.55	\$	\$	-	\$	-
5	5	CABLE DE ALUMINIO 2+1 CALIBRE 6, INCLUYE: DESINSTALACIÓN DEL EXISTENTE EN SU CASO, RESGUARDO Y ENTREGA A LA DEPENDENCIA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M		0	0.0000	0.00	200.00	0.00	\$	76.36	\$	\$	-	\$	-
0	0		0		0	0.0000	0.00	0.00	0.00	\$	-	\$	\$	-	\$	-
0	0		0		0	0.0000	0.00	0.00	0.00	\$	-	\$	\$	-	\$	-

CROQUIS		Revisión 01 2021		 GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALVAREZ 2018-2021	
Nº.	FISM-04-ICT-C/2021-VA				
Fecha:	31 DE JULIO DE 2021				
Obra:	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED DE 60 A 85 WATTS 7.000 LUMENES MÍNIMO CON VIDA MÍNIMA DE 15000 HORAS, LENTE ANTIRREFLEJO Y ALICATA MÍNIMO 85% DE TRANSPARENTES QUE SE GARANTICE DE POR UNA REMPLAZABLE EN SITO, CON DISIPADOR.				
CONTRATISTA	ING. JUAN CARLOS SANTOS ANDRADE	JEFE DE SUPERVISOR	DIR. DE A. DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DE C. N. Contrato: A ARO. HECTOR MEJIA RUELAS JEFE DE SUPERVISOR	


LOMAS ALTAS





CROQUIS		Revisión 01		2021	
No.					
Obra:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ALVAREZ	Contratista:	LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	Fecha:	31 DE JULIO DE 2021
MARTIN EDUARDO CORTES GUZMAN	ING. JUAN CARLOS SANTOS ANDRADE	ARQ. HECTOR MORALES	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED DE 50 A 55 WATTS 7,000 LUMENES MÍNIMO CON VIDA MÍNIMA DE 150,000.00 HORAS. LENTE ANTIVANDALICO CON MÍNIMO 95% DE TRANSPARENCIA QUE SE GARANTICE POR MIDA REEMPLAZABLE EN SITIO CON DISIPADOR		
CONTRATISTA	RESIDENTE O SUPER.	JEFE DE SUPERVISOR	DIRECCIÓN DE A. DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		

LINDA VISTA (AV. LOS REPORTEROS)

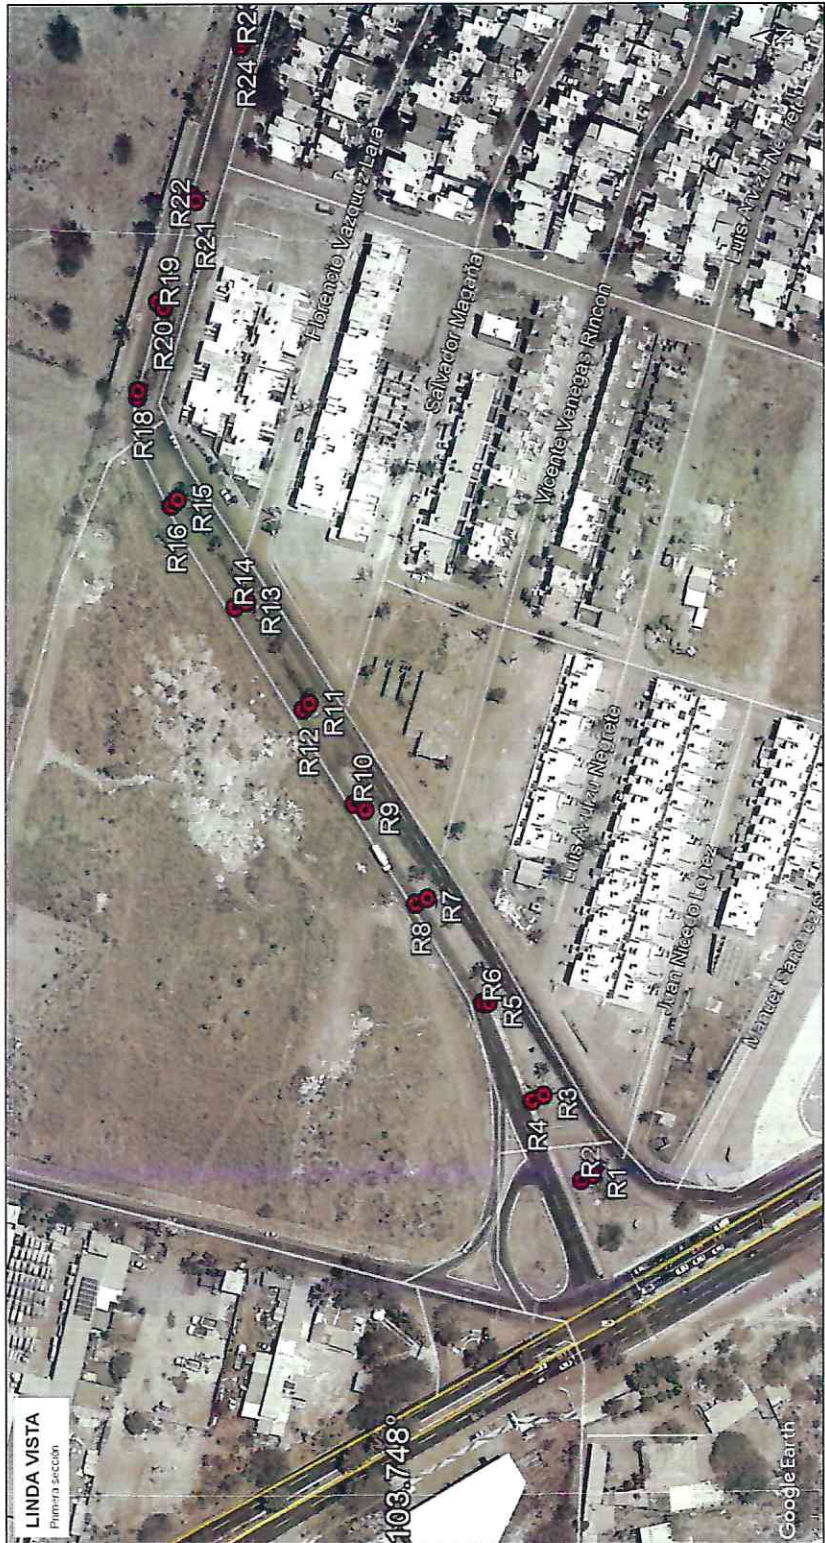

CROQUIS		Revisión 01 2021		 GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALVAREZ 2018-2021	
No.	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ALVAREZ ING. JUAN CARLOS SANTOS ANDRADE CONTRATISTA				
Obra:	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED DE 60 A 55 WATTS 7200 LUMENES MÍNIMO CON VIDA ÚTIL DE 150,000 HORAS, LENTE ANTIRREFLEJO Y CABLEADO DE ALTA CALIDAD TRANSFERENCIA DEL SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS				
Contratista:	DIR. DE A. DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS JEFE DE SUPERVISOR				
Fecha:	31 DE JULIO DE 2021				



CROQUIS		Revisión 01		2021		 GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALVAREZ 2018-2021			
No.									
Obra:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ALVAREZ	Contratista	LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO S.A. DE C.V. Contrato:	FISM-04-ICT-C/2021-VA	Fecha:	31 DE JULIO DE 2021			
MARTIN EDUARDO CORTES GUZMAN	ING. JUAN CARLOS SANTOS ANDRADE	ARQ. HECTOR RUILES	0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED DE 50 A 85 WATTS 7,000 LUMENES MÍNIMO CON VIDA MÍNIMA DE 150,000 HORAS, LENTE ANTI VANDÁLICO CON MÍNIMO 95% DE TRANSPARENCIA QUE SE GARANTICE DE POR MEDIO REMPLAZABLE EN SITIO, CON DISIPADOR					
COMITATISTA	RESIDENTE O SUPER.	JEFE DE SUPERVISOR	DIP. DE A. DE CONTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						



CROQUIS		Revisión 01		2021	
No.					
Obra:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIAS COLONIAS DE VI	Contralista	LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO S.A. DE C.V. Contrato	FISM-04-ICT-C/2021-VA	Fecha: 31 DE JULIO DE 2021
MARTÍN EDUARDO CORTÉS GUZMÁN	ING. JUAN CARLOS SANTOS ANDRADE	ARQ. HECTOR M. RIELAN	DIR. DE A. DE CONTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED DE 50 A 55 WATTS 7,000 LÚMENES MÍNIMO CON VIDA MÍNIMA DE 150,000.00 HORAS. LENTE ANTI VANDALICO CON MÍNIMO 85% DE TRANSPARENCIA QUE SE GARANTICE DE POR VIDA REMPLAZABLE EN SITIO. CON DISIPADOR	
JEFE DE SECCIÓN	RESIDENTE O SUPER.	JEFE DE SUPERVISOR			


BUROCRATAS (CALLE CARLOS DE LA MADRID)



CROQUIS		Revisión 01 2021		 GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ÁLVAREZ 2018-2021		 31 DE JULIO DE 2021	
Nº.	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIAS COLONIAS DE VI			CONTRATISTA	ING. JUAN CARLOS SANTOS ANDRADE	RESIDENTE O SUPER.	CONTRATISTA
Obra:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIAS COLONIAS DE VI			Contratista:	FISM-04-CT-C/2021-VA		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED DE 50 A 55 WATTS 7,000 LÚMENES MÍNIMO CON VIDA MÍNIMA DE 100,000.00 HORAS, LENTE ANTI VANDÁLICO CON MÍNIMO 95% DE TRANSAPARENCIA QUE SE GARANTICE DE POR VIDA REMANENTE EN SITIO, CON DISIPADOR				Fecha:			



CROQUIS		Revisión 01		2021		GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALVAREZ 2018-2021			
No.							31 DE JULIO DE 2021		
Obra:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIAS COLONIAS DE VILLAS DE ALVAREZ			CONTRALISTA			FISM-04-ICT-C/2021-VA		
MARTIN EDUARDO GONZALEZ GUZMAN	ING. JUAN CARLOS SANTOS ANDRADE			ARQ. HECTOR VILLALBA RUIZ			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED DE 60 A 55 WATTS 7,000 LÚMENES MÍNIMO		
CONTRATISTA	RESIDENTE O SUPER.			JEFE DE SUPERVISOR			CON VIDA MÍNIMA DE 150,000.00 HORAS, LENTE ANTI VANDÁLICO CON MÍNIMO 95% DE		
				DIR. DE A. DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			TRANSPARENCIA QUE SE GARANTICE DE EJECUCIÓN RENDEABLE EN SITIO, CON INSIDADOR		

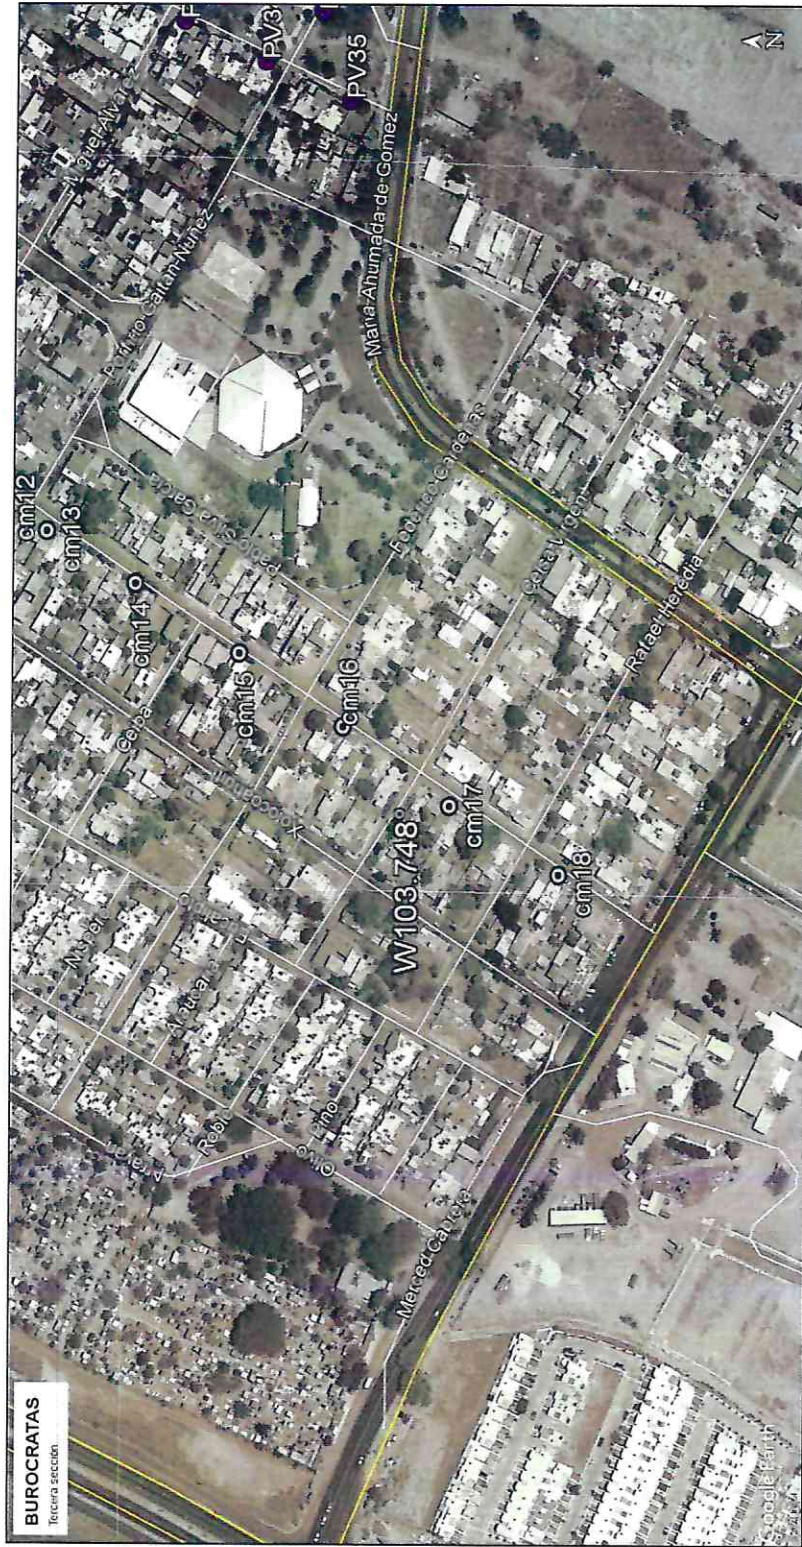

FOTOS

Revisión 01

2021



GOBIERNO MUNICIPAL
DE VILLA DE ÁLVAREZ
2018-2021



Obra: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ÁLVAREZ

Contrato: FISM-04-ICT-C/2021-VA

Contratista LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fecha: 31 DE JULIO DE 2021

No.

MARTIN EDUARDO CORTÉS GUZMAN CONTRATISTA	ING. JUAN CARLOS SANTOS ANDRADE RESIDENTE O SUPER.	ARQ. HECTOR MEJIA RUELAS JEFE DE SUPERVISOR	DIR. DE A. DE CONTRUCCIÓN DE OBRAS P
1 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED DE 50 A 55 WATTS 7,000 LÚMENES MÍNIMO CON VIDA MÍNIMA DE 150,000.00 HORAS, LENTE ANTIVANDÁLICO CON MÍNIMO 95% DE TRANSPARENCIA QUE SE GARANTICE DE POR VIDA REMPLAZABLE EN SITIO, CON DISIPADOR DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA, CARCASA DE MATERIALES ANTICORROSIVOS RESISTENTES			

COLONIA LOMAS ALTAS



FOTOS

Revisión 01
2021



GOBIERNO MUNICIPAL
DE VILLA DE ÁLVAREZ
2018-2021



Obra: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ÁLVAREZ
 Contrato: FISM-04-ICT-C/2021-VA
 Contratista: LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO S.A. DE C.V.
 Fecha: 31 DE JULIO DE 2021

No.

MARTÍN EDUARDO CORTÉS GUZMAN CONTRATISTA	ING. JUAN CARLOS SANTOS ANDRADE RESIDENTE O SUPER.	ARQ. HECTOR MEJÍA RUELAS JEFE DE SUPERVISOR	0 DIR. DE A. DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS P
---	---	--	--

COLONIA LINDA VISTA (Av. LOS REPORTEROS)



FOTOS

Revisión 01
2021

GOBIERNO MUNICIPAL
DE VILLA DE ÁLVAREZ
2018-2021




Obra: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ÁLVAREZ
Contrato: FISM-04-ICT-C/2021-VA
Contratista LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fecha: 31 DE JULIO DE 2021

No.

MARTÍN EDUARDO CORTÉS GUZMAN CONTRATISTA	ING. JUAN CARLOS SANTOS ANDRADE RESIDENTE O SUPER.	ARQ. HECTOR MEJÍA RUELAS JEFE DE SUPERVISOR	DIR. DE A. DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS P
---	---	--	---------------------------------------

COLONIA BUROCRATAS (C. CARLOS DE LA MADRID)

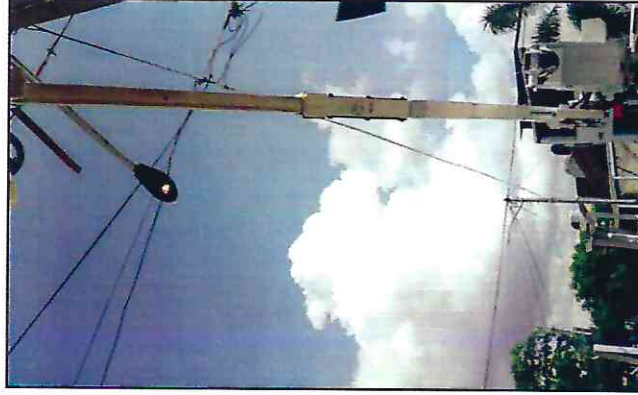

**BITÁCORA DE OBRA
DIR. DE CONSTRUCCIÓN**

revisión 01
2021



GOBIERNO MUNICIPAL
DE VILLA DE ÁLVAREZ
2018-2021



Contrato No.: FISM-04-ICT-C/2021-VA
Obra: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ÁLVAREZ
Ubicación: VARIAS COLONIAS COL. MONTELLANO, REAL DE MINAS, LOMAS ALTAS, CARLOS DE LA MADRID, SOLIDARIC
Contratista: LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fecha: 28 de Julio de 2021

FOLIO N°
0001


NO. de Licitación= FISM-04-ICT-C/2021-VA
Proyecto= FISM-21-010 Rehabilitación de Alumbrado Público
en varias colonias de villa de Álvarez.

Se autoriza por parte de la dependencia la colocación de
luminarias modelo y tipo de acuerdo a lo contratado en la colonia
LOMAS ALTAS del municipio de villa de Álvarez, Colima.

Se autoriza por parte de la dependencia el retiro y sustitución
de 58 (cincuenta y ocho) ptas. en esta colonia.

La colocación de estas luminarias se hizo de acuerdo al proyecto
(plano de sembrado) proporcionado por el Área de proyectos de la
Dirección de Planeación y Desarrollo municipal del H. Ayuntamiento
de villa de Álvarez.

CRÓQUIS.- CUANDO SEA NECESARIO PARA INDICAR LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS Y/O
ESPECIFICACIONES.


SUPERVISOR Y/O RESIDENTE


SUPERINTENDENTE DE OBRA



Contrato No.: FISM-04-ICT-C/2021-VA
Obra: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ÁLVAREZ
Ubicación: VARIAS COLONIAS COL. MONTELLANO, REAL DE MINAS, LOMAS ALTAS, CARLOS DE LA MADRID, SOLIDARIC
Contratista: LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fecha: 28 de julio de 2021

FOLIO N°
0002


No. de licitación = FISM-04-ICT-C/2021-VA
Proyecto = FISM-21-010 Rehabilitación de Alumbrado Público en varias colonias de Villa de Álvarez

Se autoriza por parte de la dependencia la colocación de luminarias, modelo y tipo de acuerdo a lo contratado en la colonia Linda Vista por la calle Reparteros del municipio de Villa de Álvarez, Colima.

Se autoriza por parte de la Dependencia el retiro y sustitución de 49 (cuarenta y nueve) prns. en esta colonia.

La colocación de estas luminarias se hizo de acuerdo al proyecto (Plano de Sembrado) proporcionado por el Área de proyectos de la Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.

CRÓQUIS.- CUANDO SEA NECESARIO PARA INDICAR LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES.


SUPERVISOR Y/O RESIDENTE


SUPERINTENDENTE DE OBRA



Contrato No.: FISM-04-ICT-C/2021-VA

Obra: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ÁLVAREZ

Ubicación: VARIAS COLONIAS COL. MONTELLANO, REAL DE MINAS, LOMAS ALTAS, CARLOS DE LA MADRID, SOLIDARIC

Contratista: **LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO S.A. DE C.V.**

Fecha: 28 de julio de 2021

FOLIO N°
0003

No. de licitación = FISM-04-ICT-C/2021-VA

Proyecto = FISM-21-010 Rehabilitación de Alumbrado público en varias colonias de Villa de Alvarez.

Se autoriza por parte de la dependencia la colocación de
luminarias modelo y tipo de acuerdo a lo contratado, en la colonia
Burocratas calle Carlos de la Madrid del mpio. de V. de A., Colima.

Se autoriza por parte de la dependencia el retiro y sustitución de 18 (Dieciocho) prar. en esta colonia.

La colocación de estas luminarias se hizo de acuerdo al proyecto (planos de sembrado) proporcionado por el Área de proyectos de la Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal del H. Ayuntamiento de Villa de Alvarez.

CRÓQUIS.- CUANDO SEA NECESARIO PARA INDICAR LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES.

SUPERVISOR Y/O RESIDENTE

SUPERINTENDENTE DE OBRA

**BITÁCORA DE OBRA
DIR. DE CONSTRUCCIÓN**

revisión 01
2021



GOBIERNO MUNICIPAL
DE VILLA DE ÁLVAREZ
2018-2021



Contrato No.: FISM-04-ICT-C/2021-VA

Obra: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ÁLVAREZ

Ubicación: VARIAS COLONIAS COL. MONTELLANO, REAL DE MINAS, LOMAS ALTAS, CARLOS DE LA MADRID, SOLIDARIC

Contratista: LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fecha: 30 de Julio de 2021

FOLIO N°
0004

No. de licitación = FISM-04-ICT-C/2021-VA
Proyecto - FISM-21-910 Rehabilitación de Alumbrado Público
en varias colonias de Villa de Álvarez.

Se autoriza por parte de la Dependencia municipal la colo-
cación de luminarias en la colonia Linda Vista, por la Av. Repor-
teros, desde la rotonda a Baulala hasta la Calle Xolocapan
considerándose 46 posts dobles en poste individual y 3 posts
individuales.

CRÓQUIS.- CUANDO SEA NECESARIO PARA INDICAR LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS Y/O
ESPECIFICACIONES.



SUPERVISOR Y/O RESIDENTE



SUPERINTENDENTE DE OBRA
